


Conférence de presse Voie sur berges 1re ligne de tramway



20-01-2009



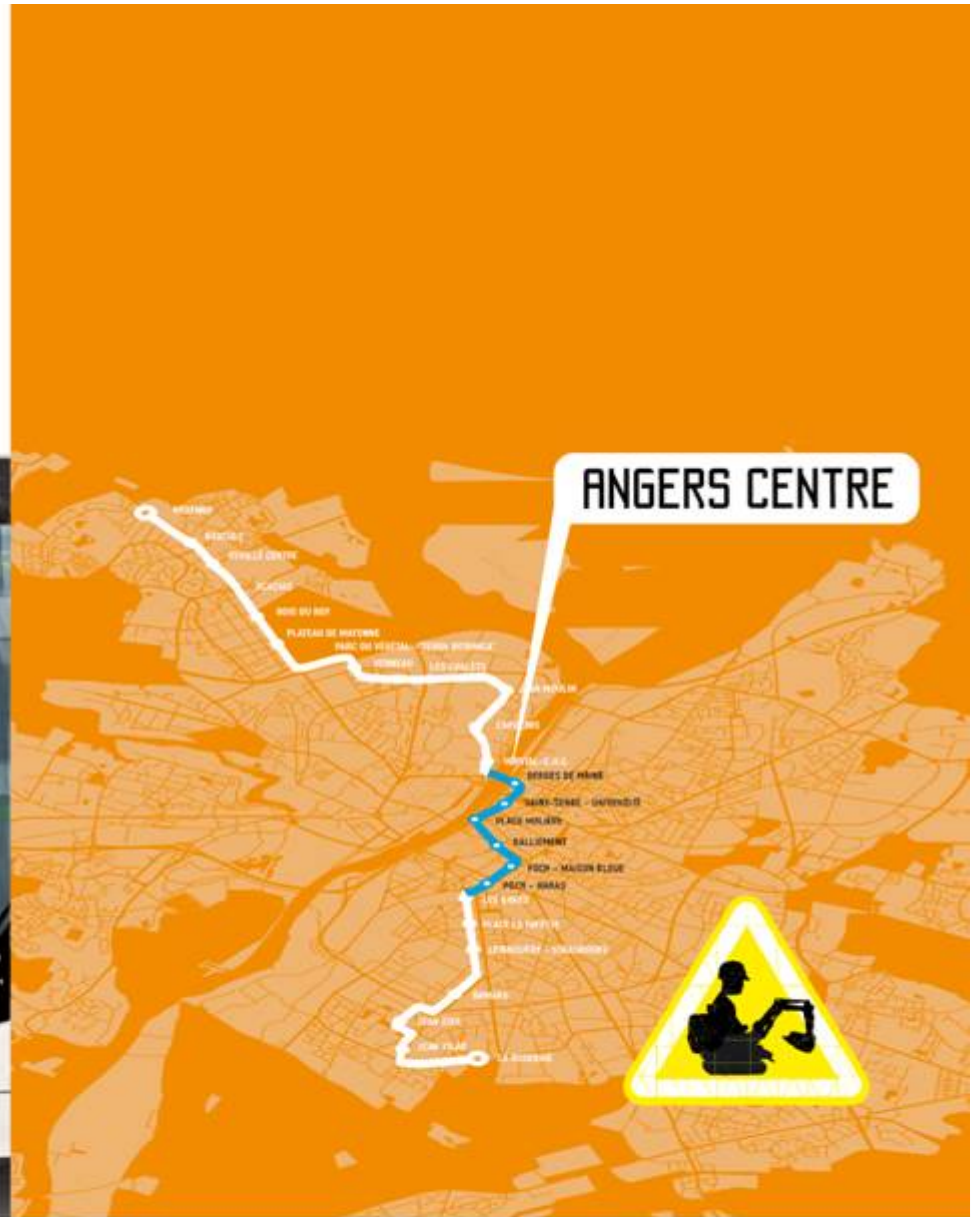

LE PONT SUR LA MAINE



Vue du pont sur la Maine rive droite

20-01-2009

[Conférence de presse - Voie sur berges]



Vue du pont sur la Maine




Vue de l'esplanade - côté Multiplexe

20-01-2009

[Conférence de presse - Voie sur berges]

1.1. État actuel des travaux


- Chantier débuté en février 2008

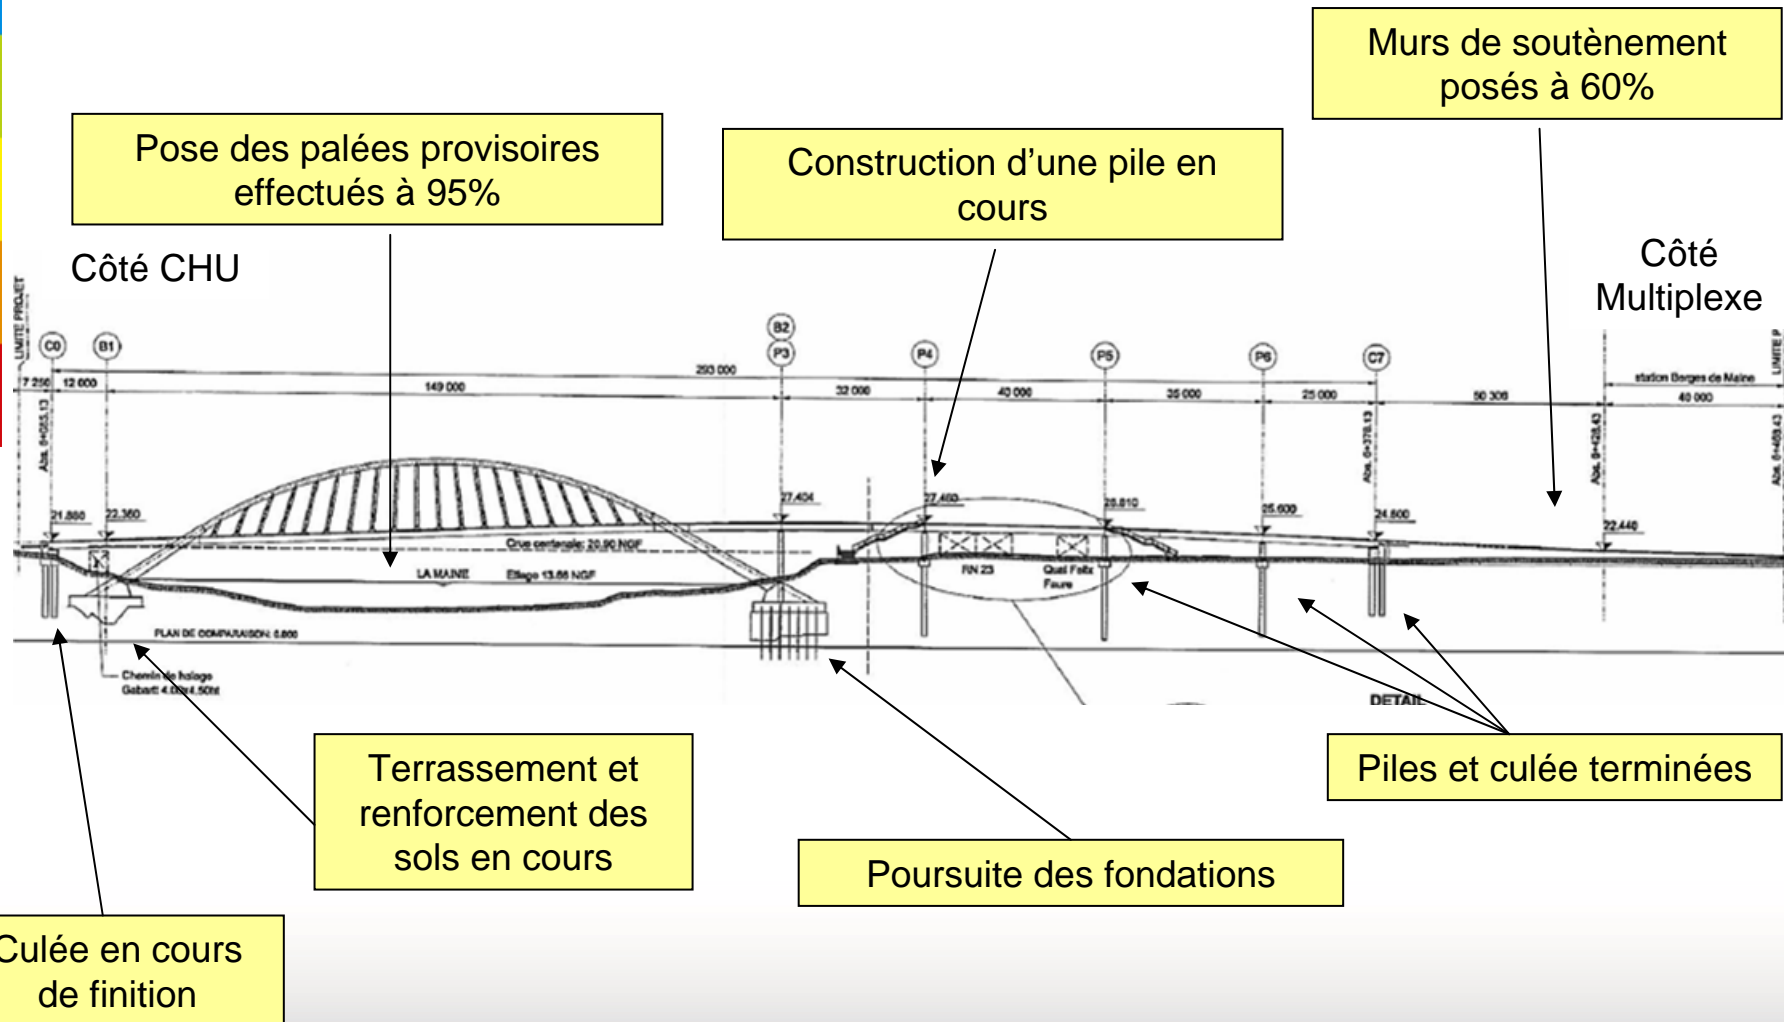





1.2. Travaux à venir

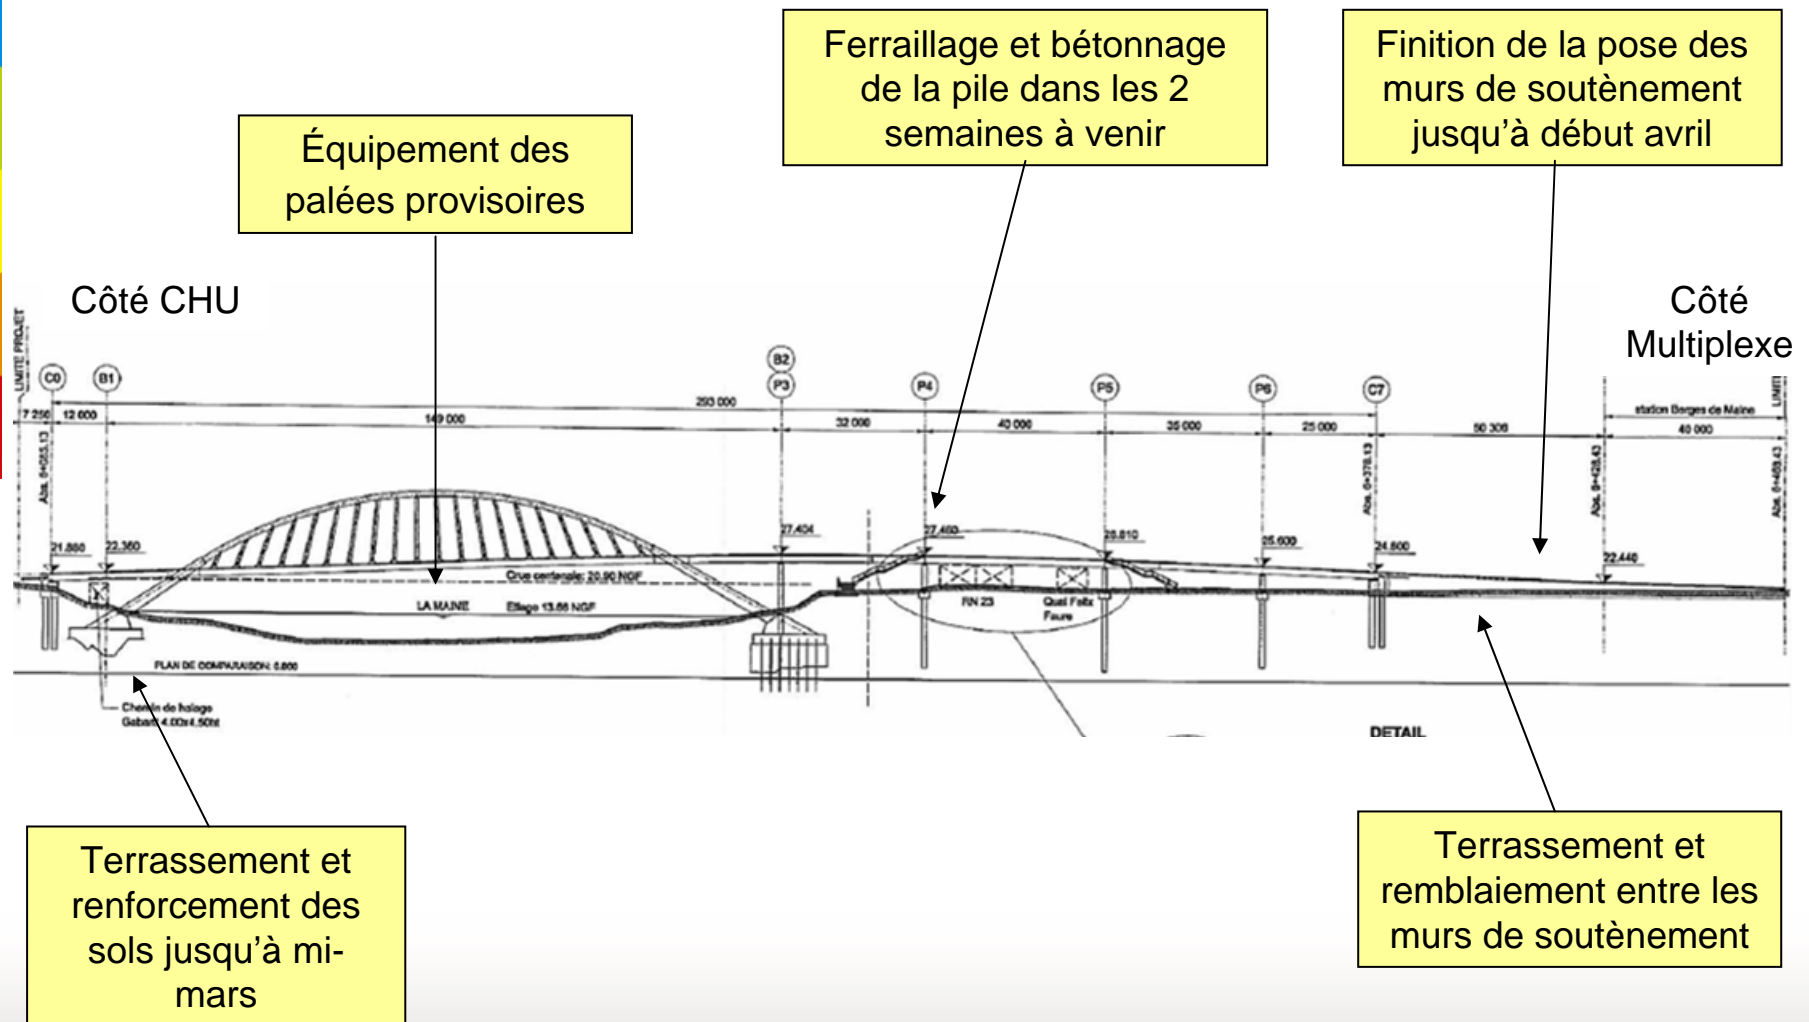



Visites du chantier du pont

- Visites gratuites du chantier du pont sur la Maine
- Sur inscription à la maison du tramway, au 0800 104 204, appel gratuit d'un poste fixe



TRAVAUX DE LA VOIE SUR BERGES



2.1. Calendrier prévisionnel

- Travaux en **2 phases** :

- ➔ Vacances d'hiver : **du samedi 7 au dimanche 23 février**

- ➔ Vacances de printemps : **du samedi 4 au dimanche 19 avril**

- Sauf aléas techniques et/ou météorologiques

- Périodes choisies pour les baisses de flux de circulation constatées



2.2. Objectif des travaux

- Abaissement de la voie sur berges d'environ 50cm sur 300m de long environ
- Objectif : autoriser un gabarit de 5m sur la voie des berges une fois l'ouvrage réalisé.
- Interventions sans interruption



2.3. Déroulement des travaux en février


3 phases de travaux

- Phase A : enlever la glissière de sécurité centrale
- Phase B : abaisser la voie sur berges côté Maine
- Phase C : construire une double glissière de sécurité et mettre en place une voirie provisoire.

2.3.1. Déroulement des travaux en février

- **Phase A** : enlever la glissière de sécurité centrale


- **Samedi 7 et dimanche 8 février**

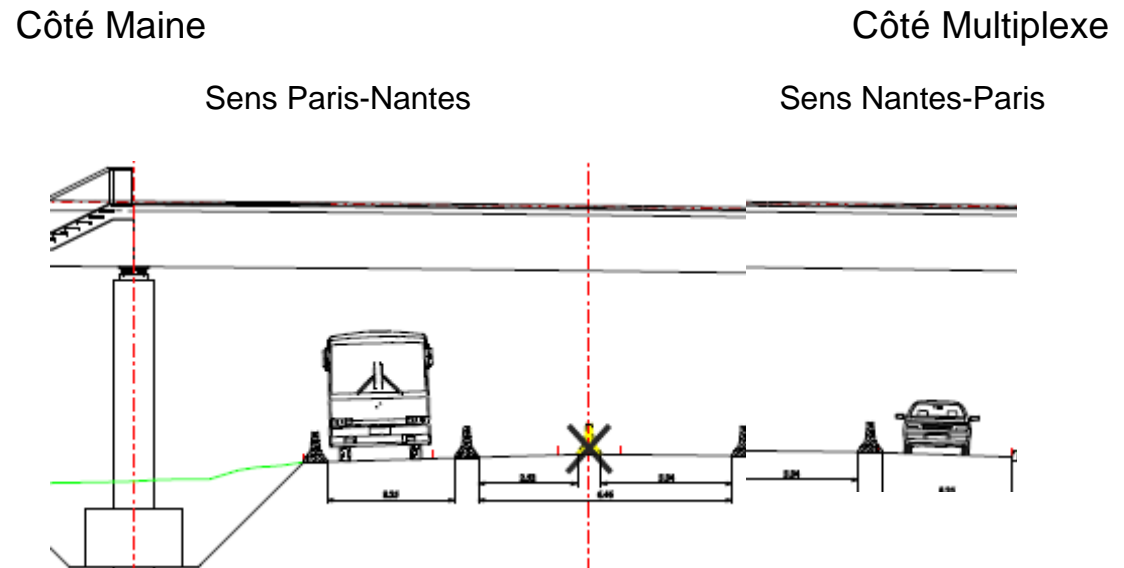

2.3.2. Déroulement des travaux en février

- **Phase B** : abaisser la voie sur berges côté Maine et interventions légères sur réseaux d'assainissement et d'éclairage public


- Du **lundi 9** au **vendredi 21 février**

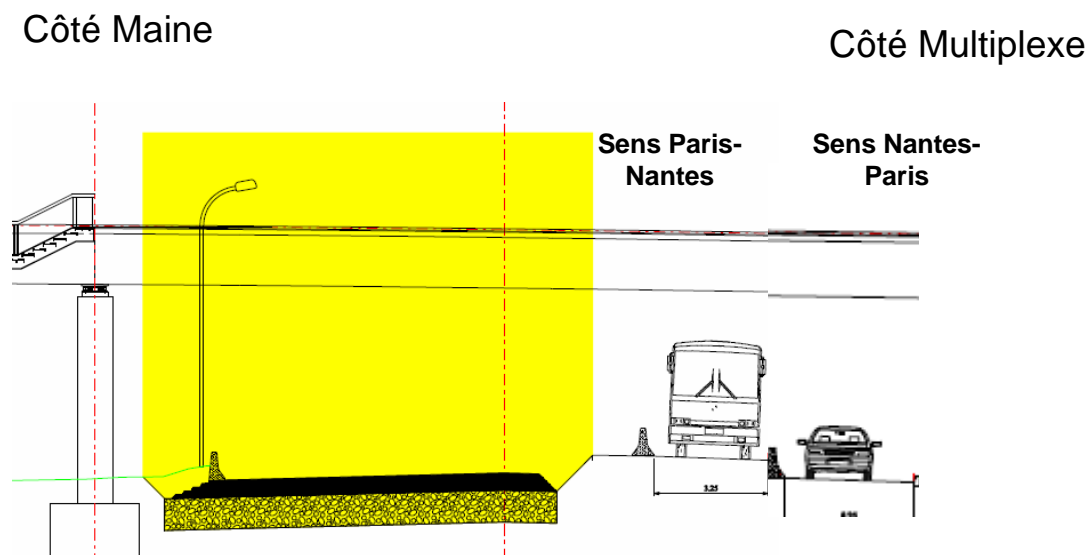

2.3.3. Déroulement des travaux en février

- **Phase C** : construire une double glissière de sécurité et mettre en place une voirie provisoire

- **Samedi 22 et dimanche 23 février**

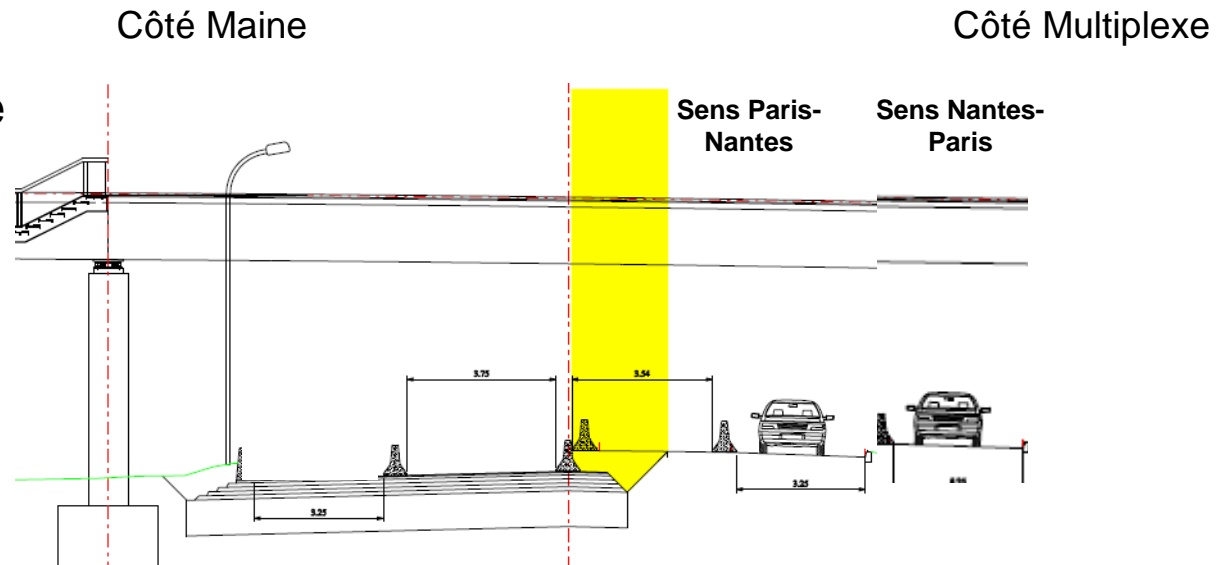



2.4. Circulation

- **2 phases**


- ➔ Samedi 7 et dimanche 8 février (phase de travaux A)


- ➔ Du lundi 9 au dimanche 23 février (phases de travaux B et C)

- Circulation maintenue dans les deux sens, 2x1 voie

- En direction de Paris : accès à la voie sur berges fermé depuis le boulevard Ayrault.

- ➔ Les automobilistes sont invités à emprunter le carrefour Jean-Moulin.

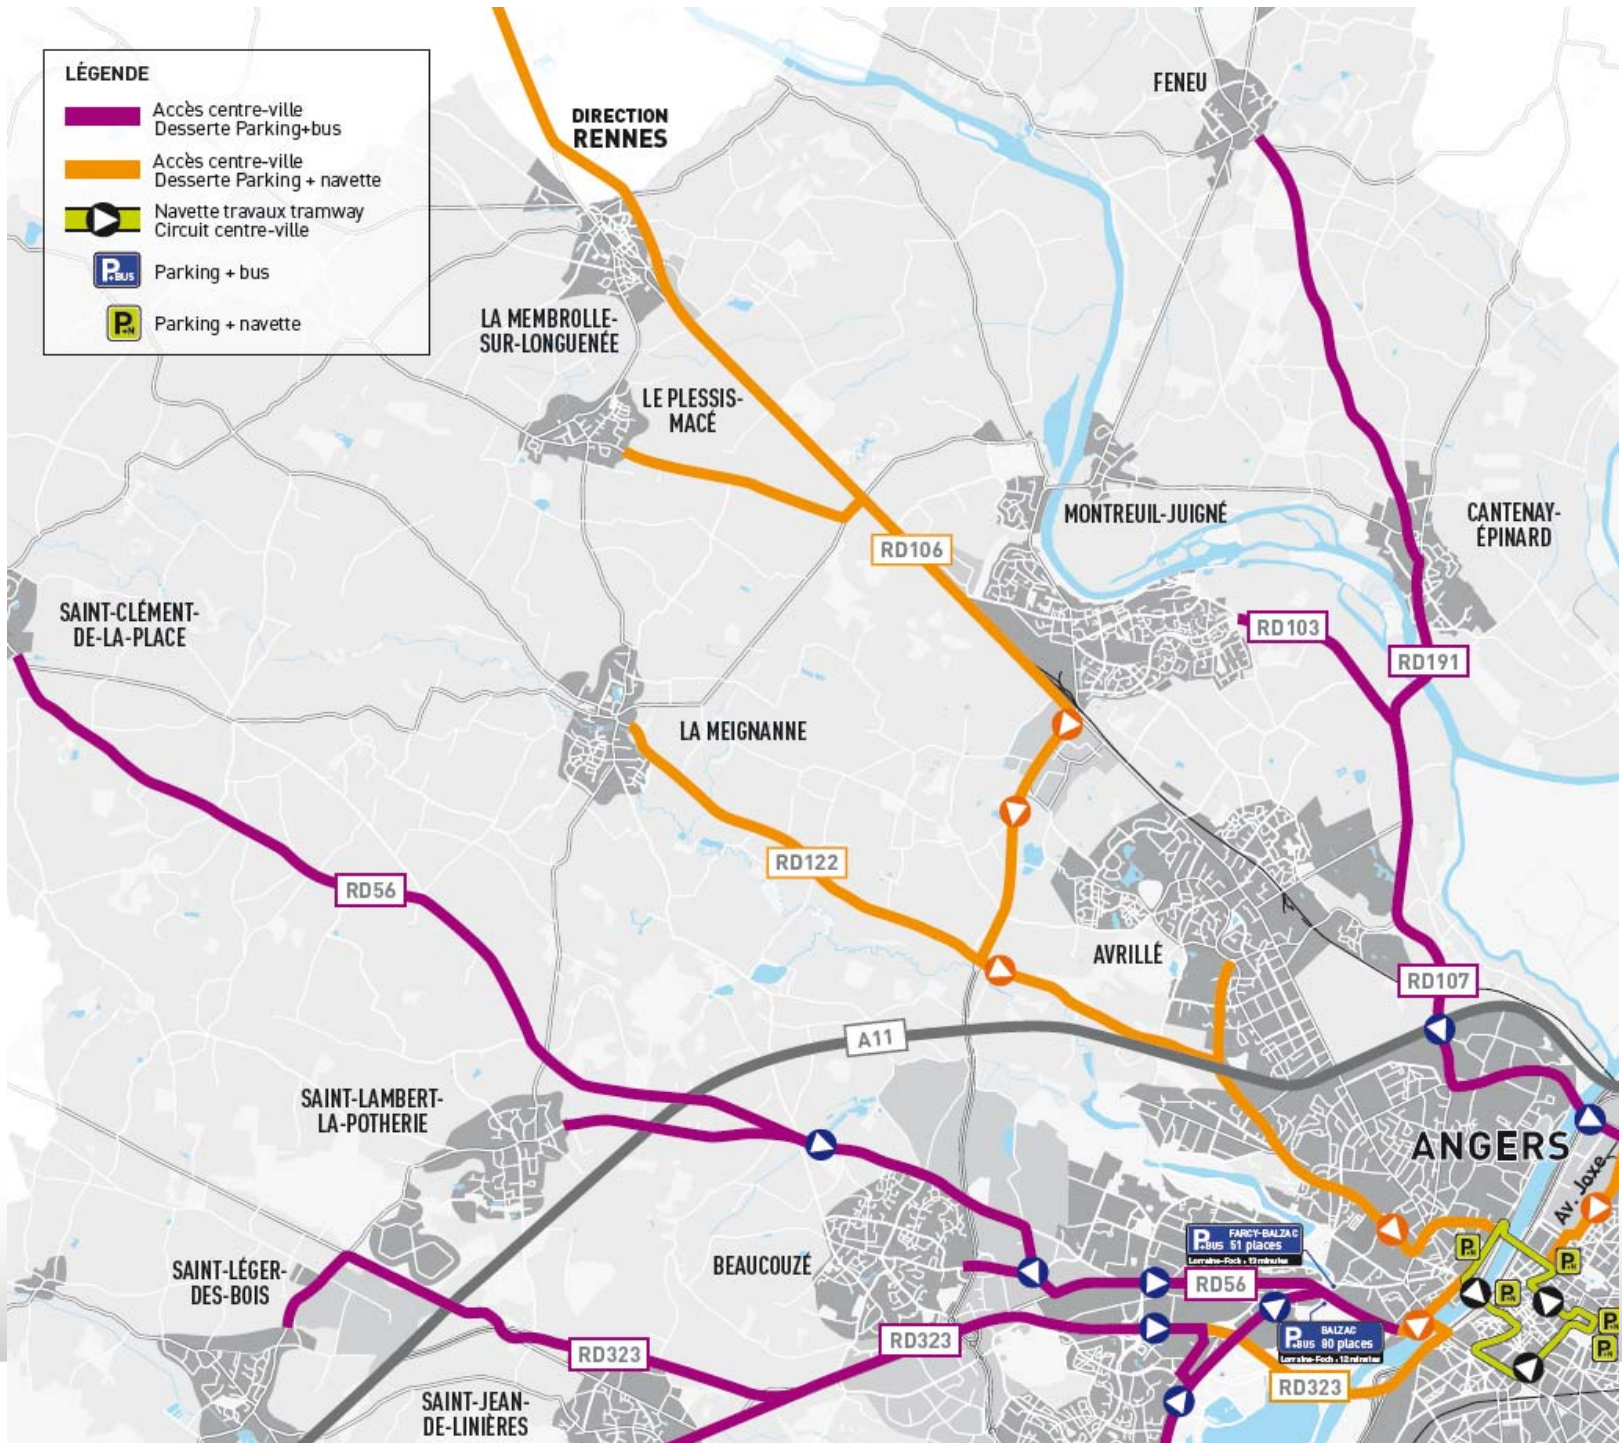


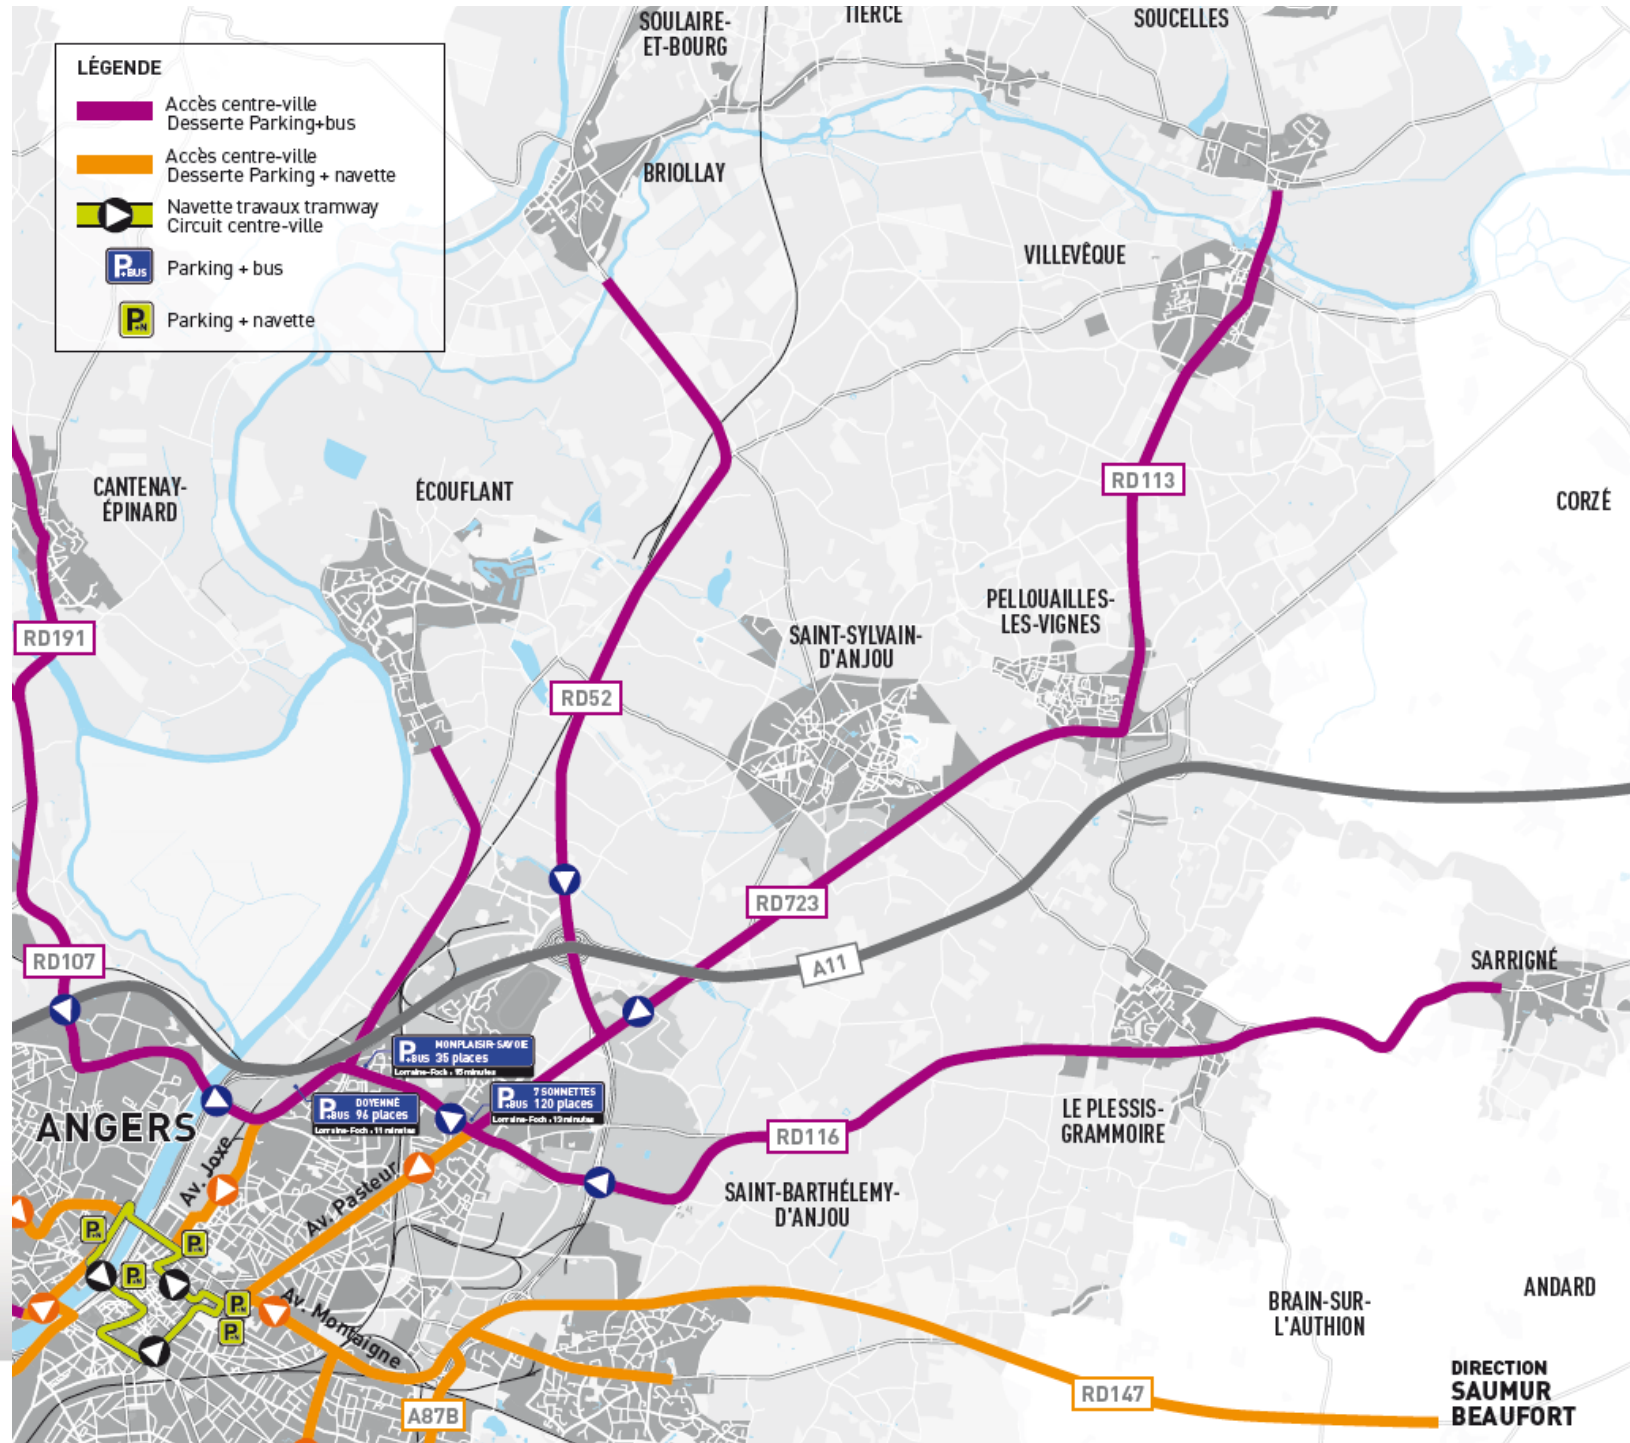

Phase 1

**Samedi 7 et dimanche
8 février**



(Enlever la glissière centrale
de sécurité)

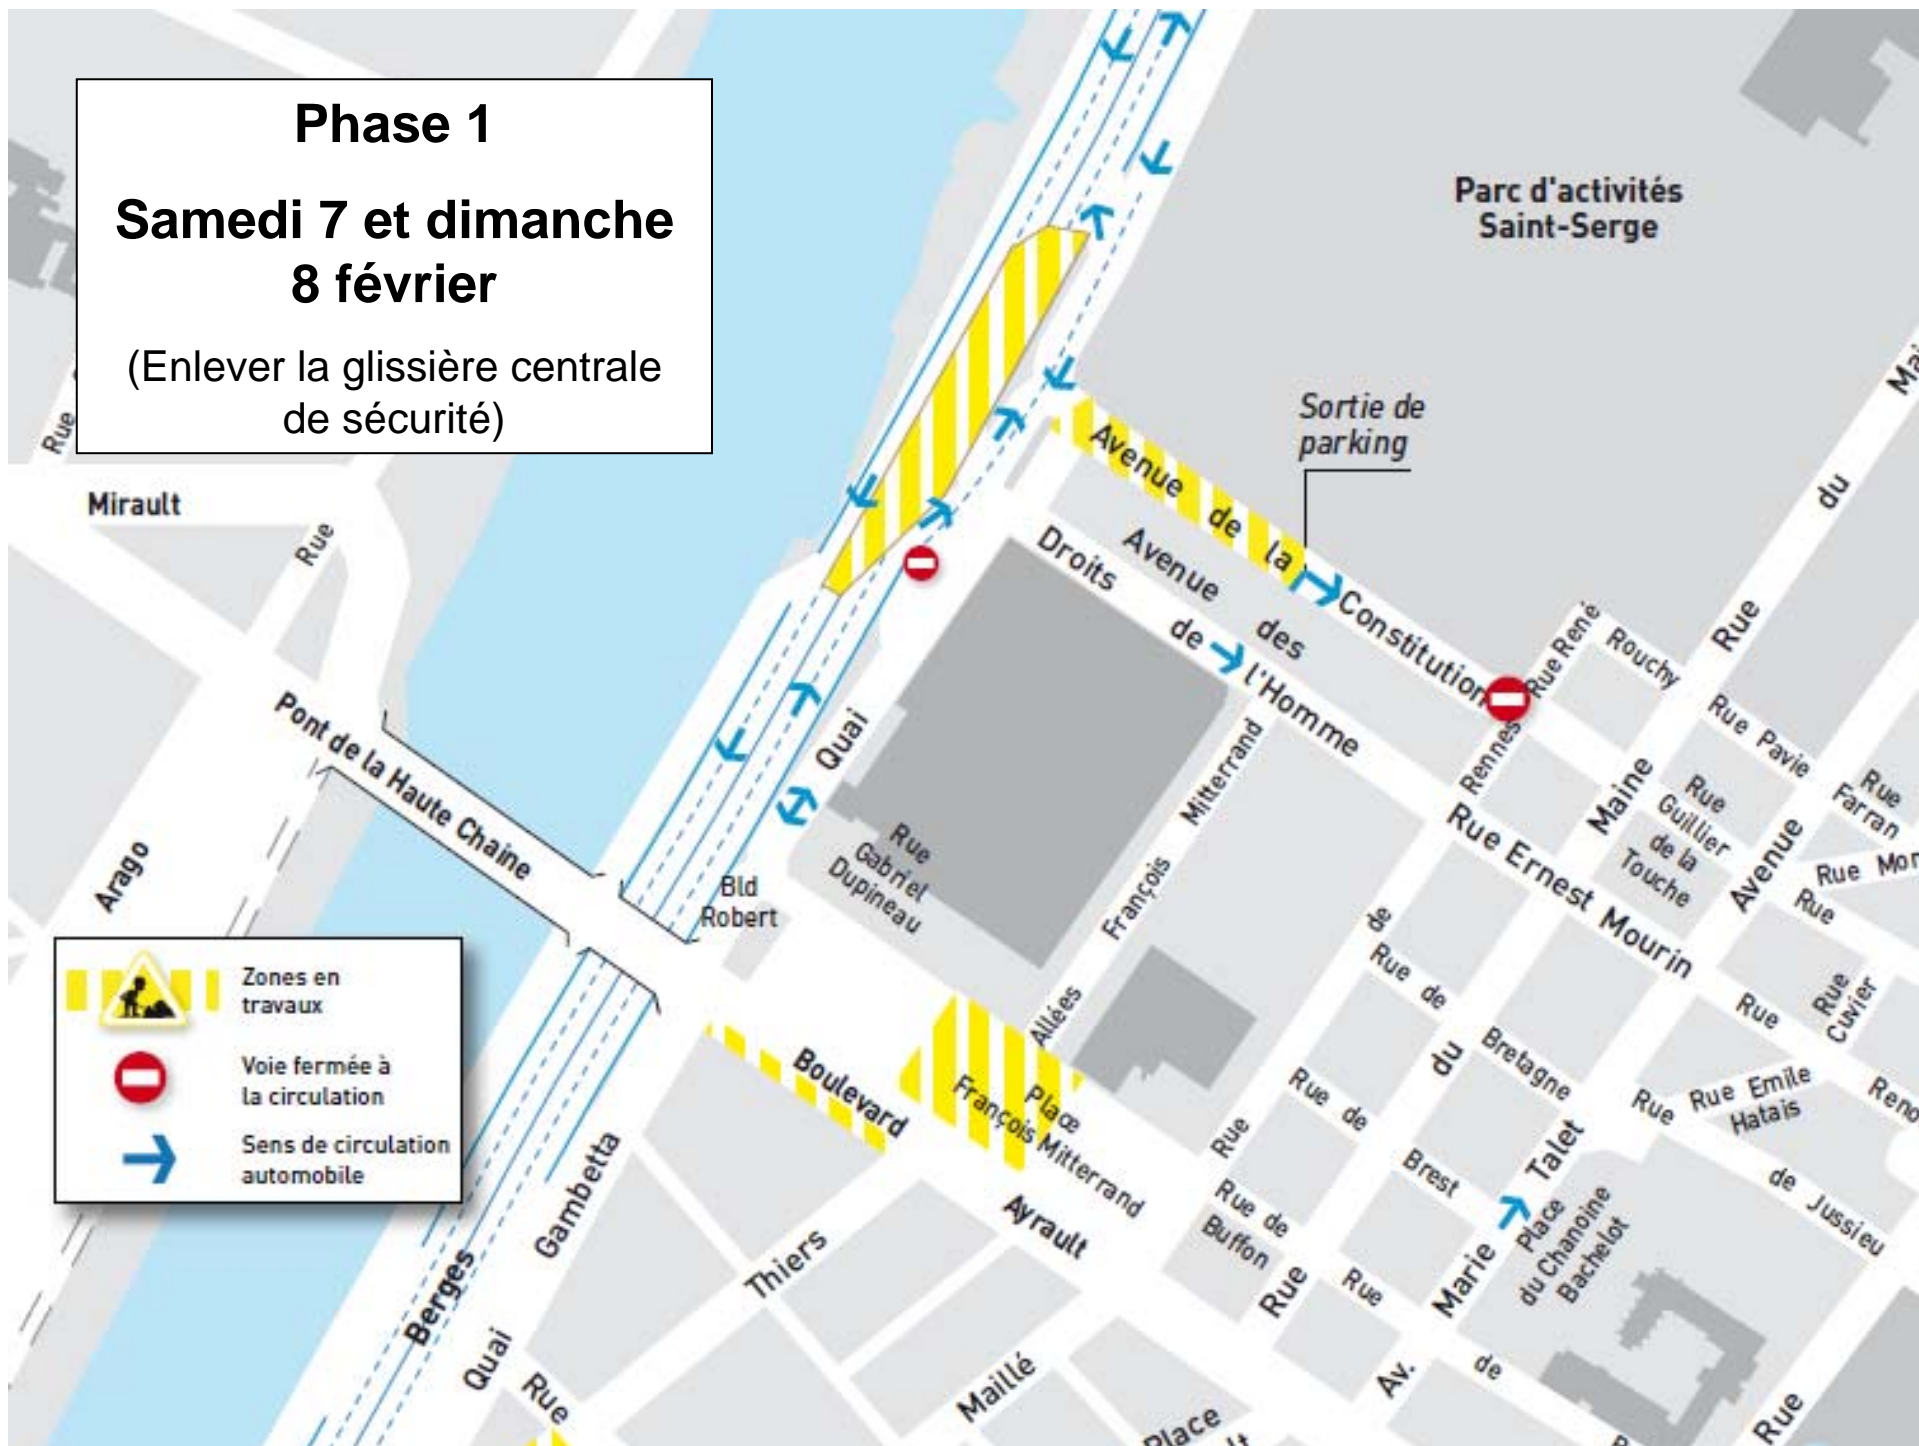

Phase 2

**Du lundi 9 au dimanche
23 février**

(Abaisser la voie sur berges,
construire une double glissière de
sécurité centrale)

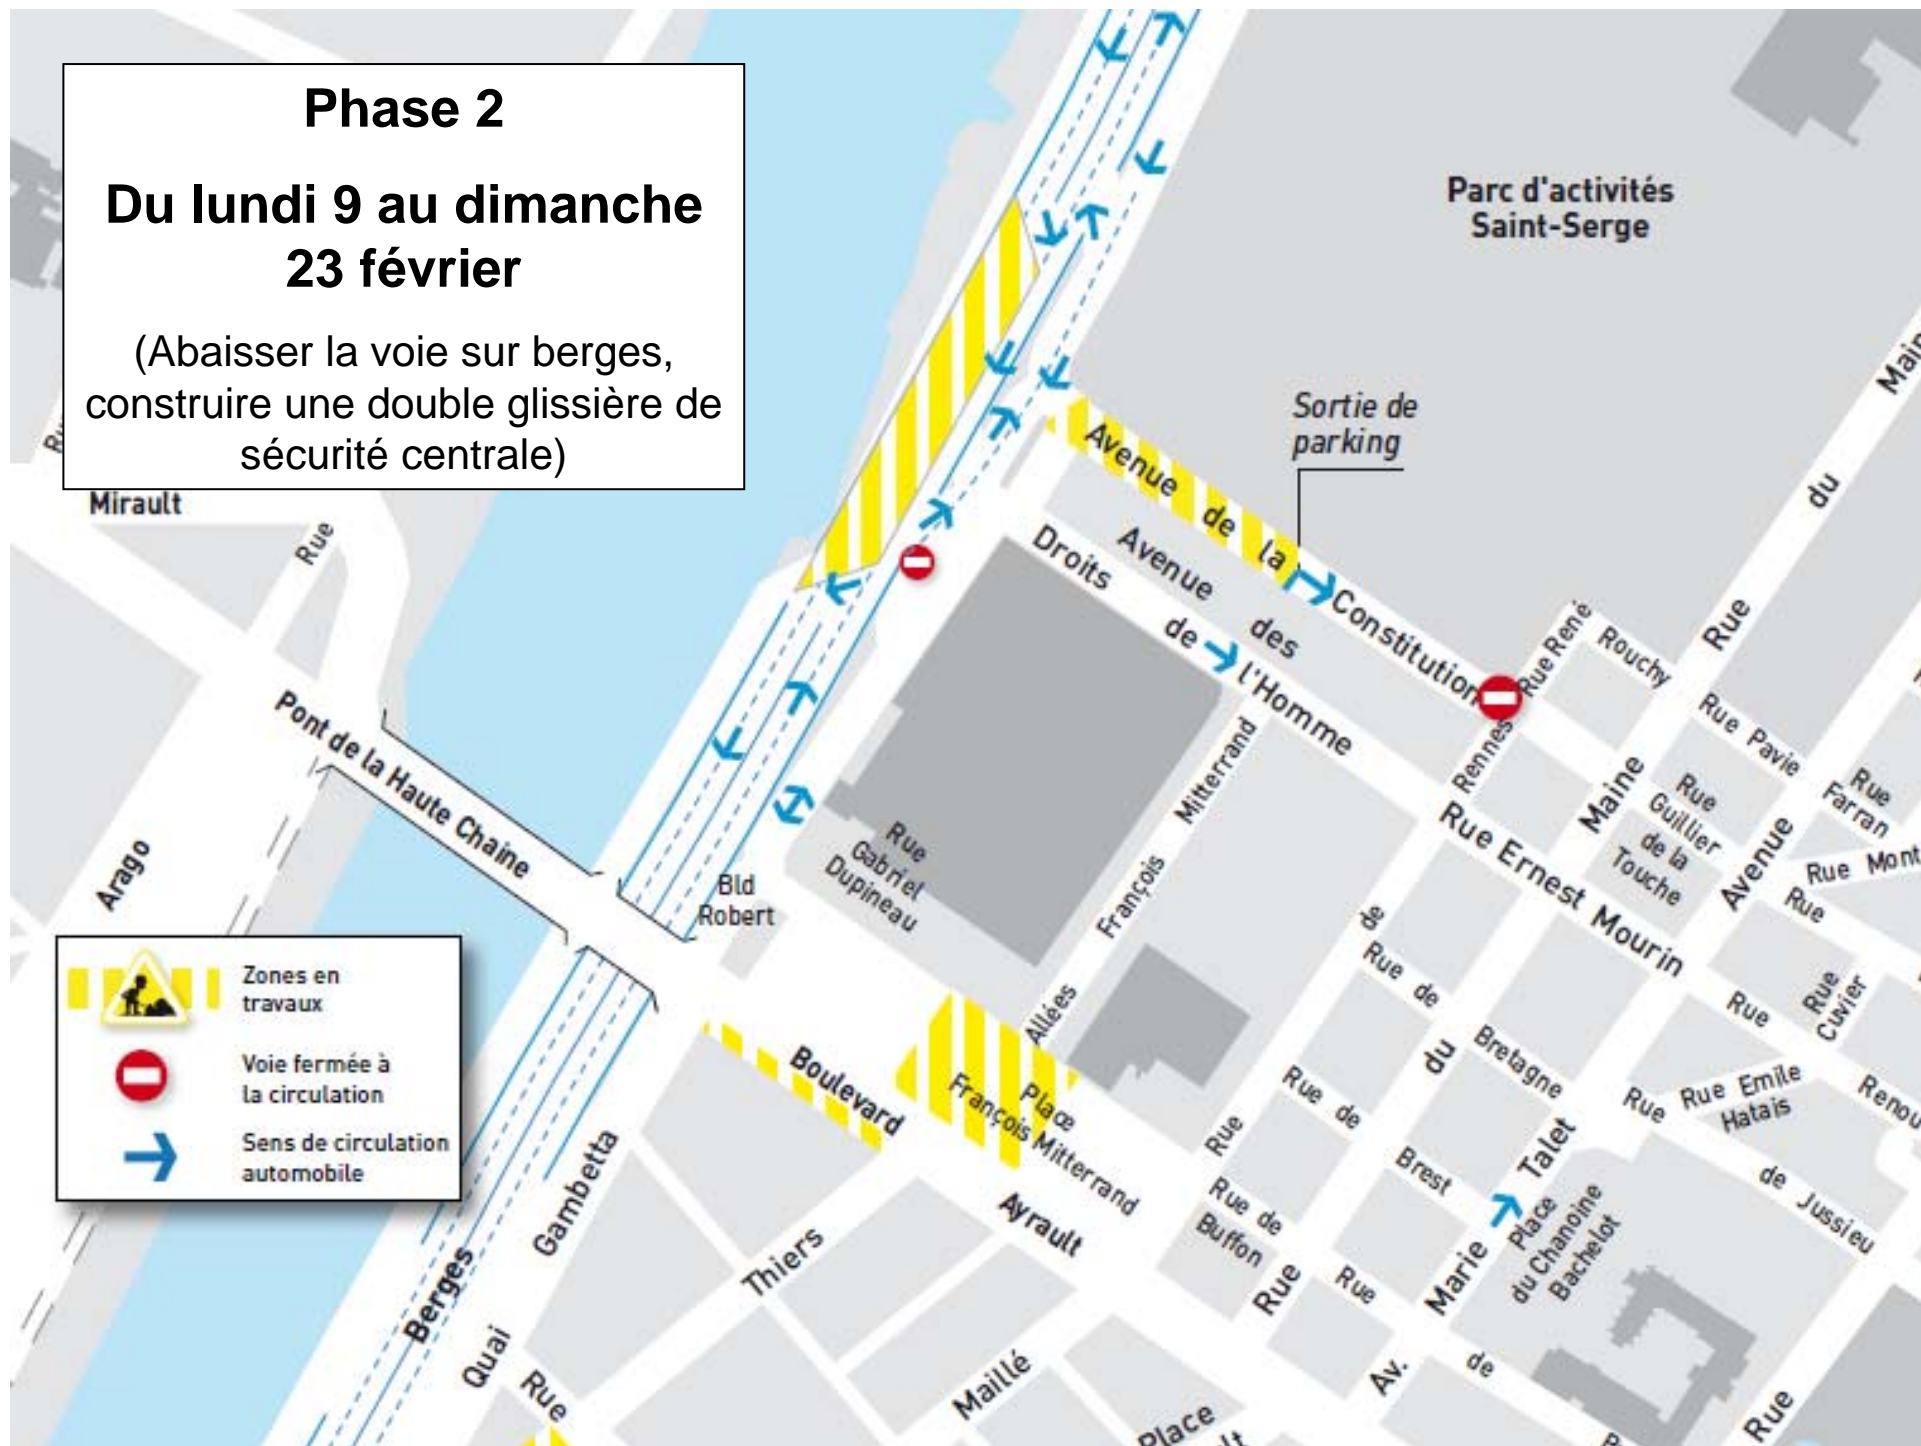




2.5. Info bus

- Déviation de la ligne 10
- Pendant toute la durée de ces travaux
- Vers Doyenné dévié par les avenues Marie-Talet, Besnardière et Jean-Joxé
 - ➔ arrêts Mitterrand, Université Saint-Serge, Peugeot et Citroën supprimés
- Sens Doyenné-Guillebotte/Sorges inchangé

Info bus du samedi 7 au dimanche 23 février

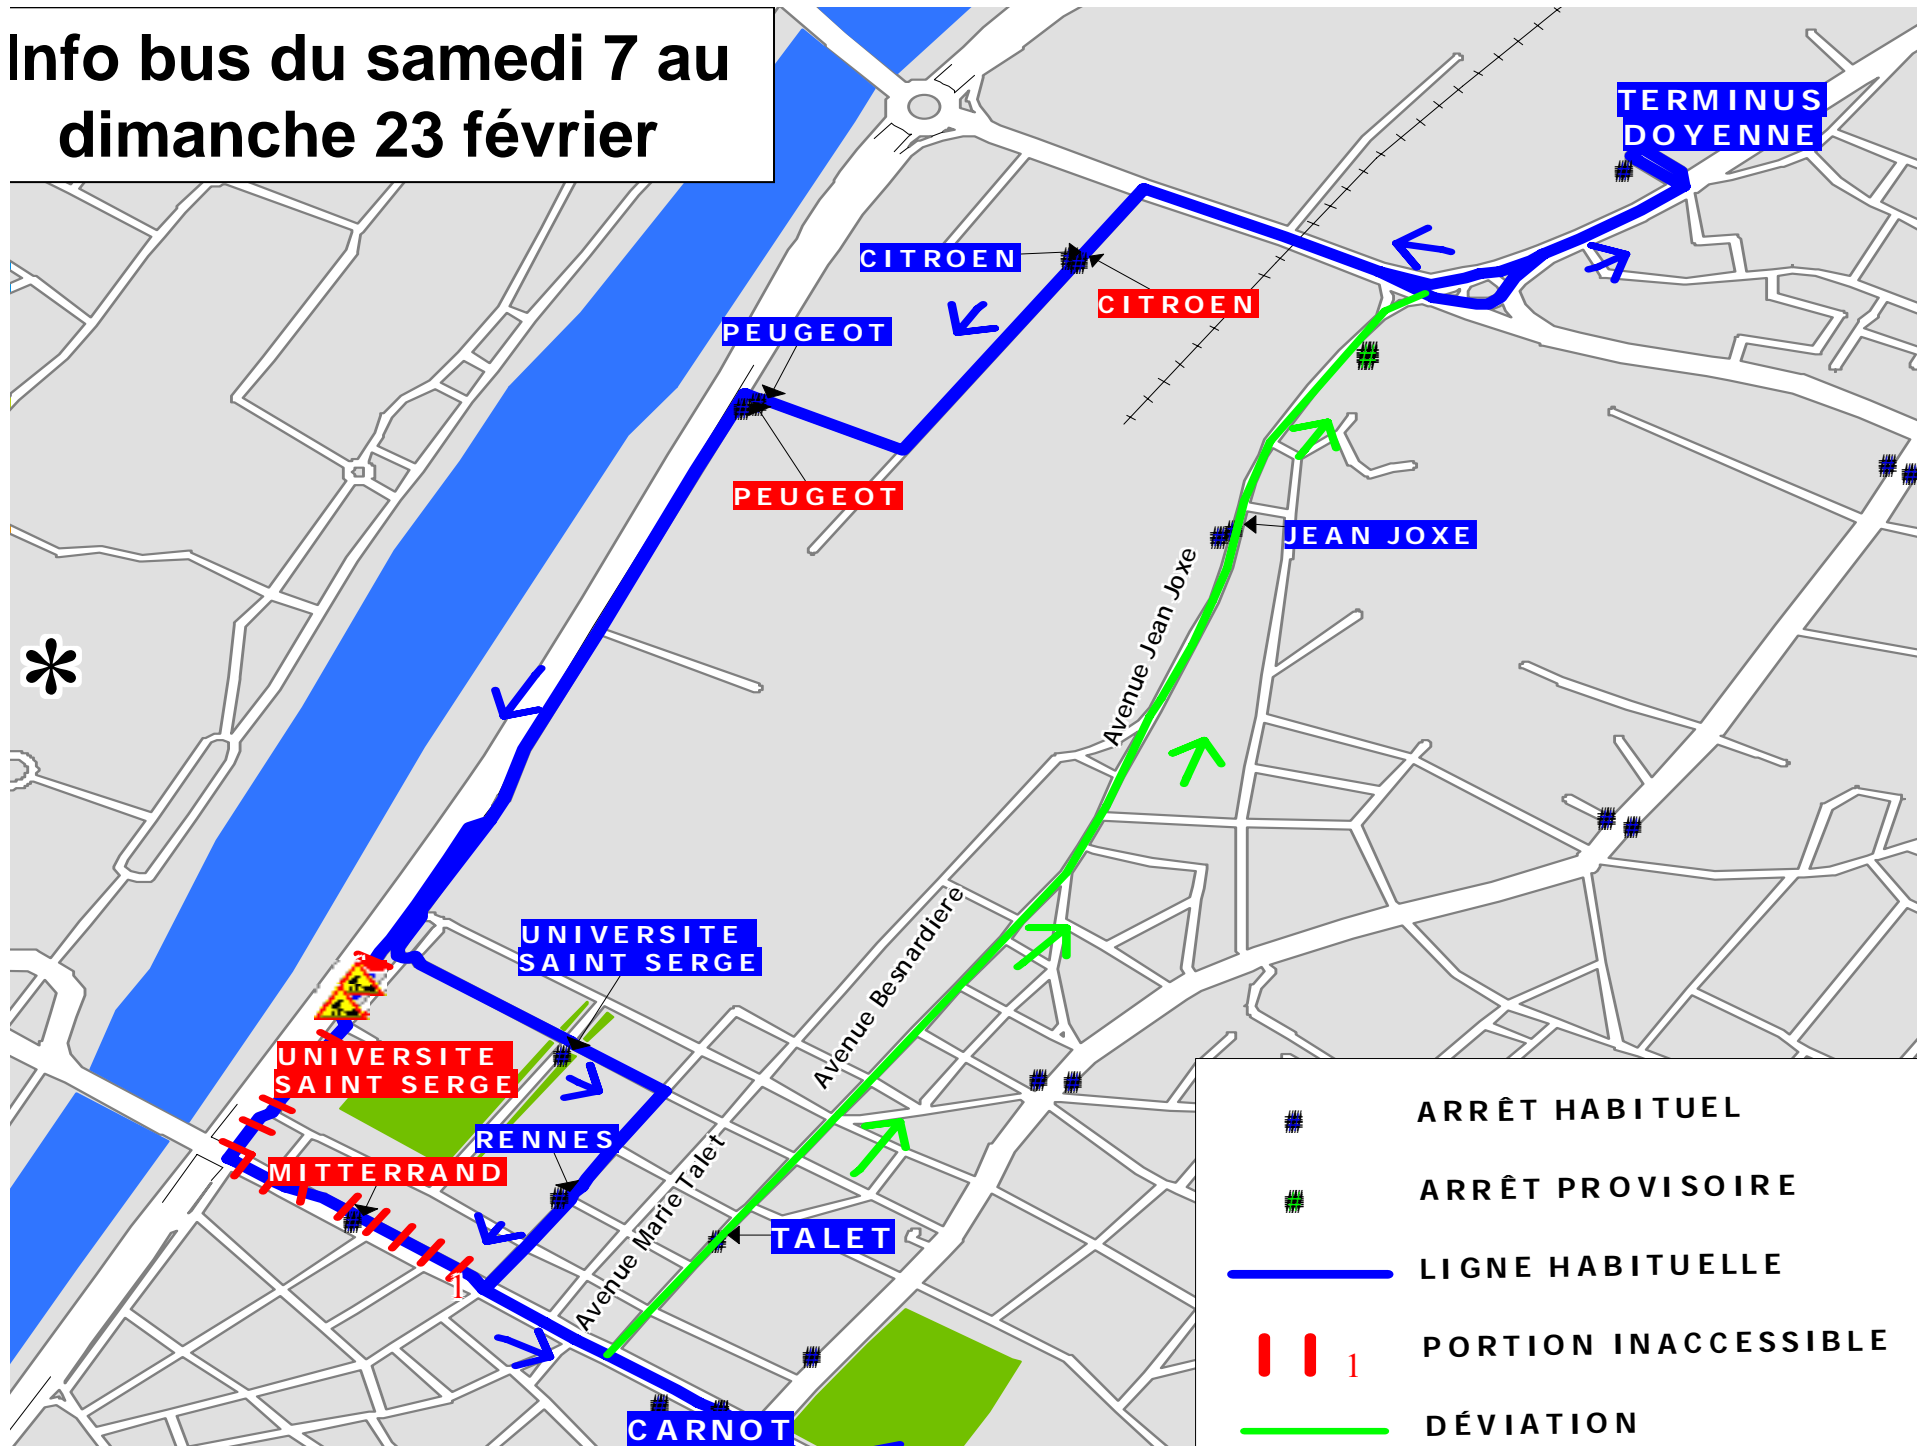



INFORMATION ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT



Information et mesures d'accompagnement

Contact du lundi au vendredi :

Yamina ELOUARDI - 06 66 62 19 91

**Médiatrice tramway de l'avenue de la
Constitution au boulevard Ayrault**





Information et mesures d'accompagnement

- **Maison du Tramway** : 25 200 visiteurs depuis l'ouverture en décembre 2007

- **Le numéro vert**
d'un poste fixe

 **N° Vert** **0 800 104 204**


appel gratuit

- **Signalétique sur site facilement identifiable**
- **Lettres d'information régulières**



Information et mesures d'accompagnement

- **Site Internet** : <http://tramway.angersloiremetropole.fr>, 67 500 visites environ en 2008
- **Carte interactive** de suivi des travaux sur le site Internet
- **Webcam** sur le site Internet permettant de suivre en temps réel l'avancée du chantier du pont sur la Maine.
- **Information SMS** : mise en service en juillet 2008, 218 inscrits, 5030 SMS envoyés

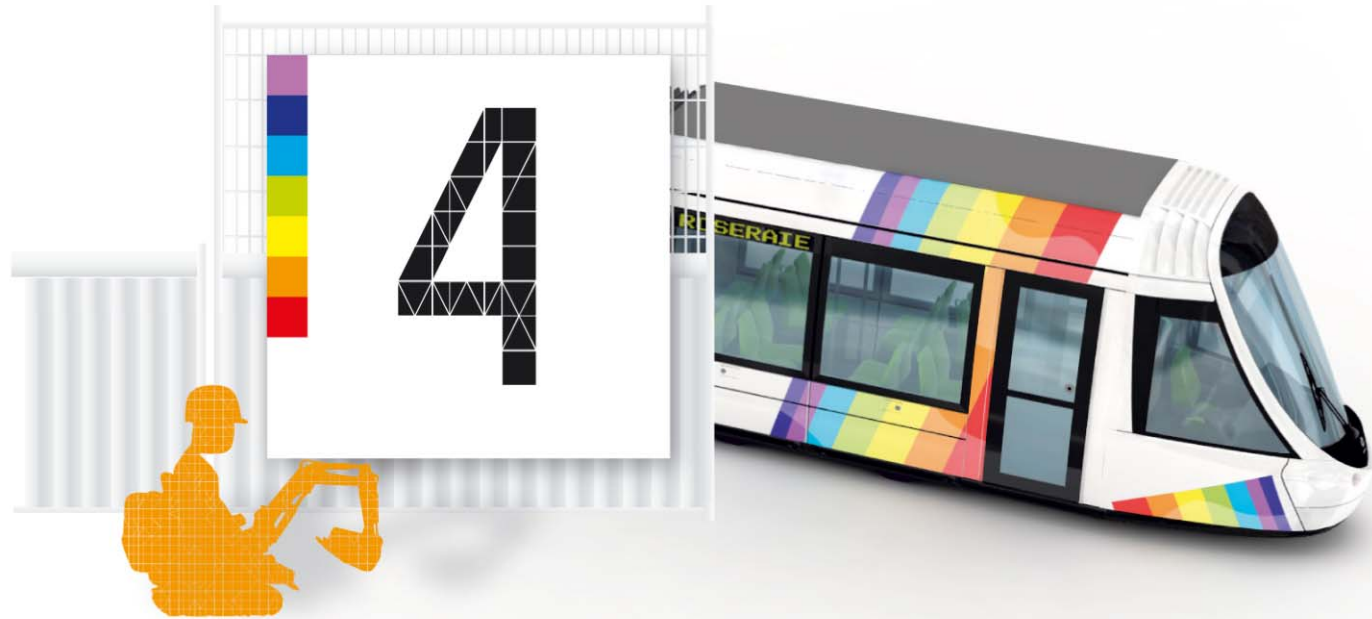

QUESTIONS/REponses



Angers Loire Métropole MAISON DU TRAMWAY

Accueil : 12 place Imbach 49100 Angers
Courrier : 83, rue du Mail - BP 80529
49105 ANGERS cedex 02 • Fax : 02 41 05 59 49

N°Vert 0 800 104 204

tramway@angersloiremetropole.fr
www.angersloiremetropole.fr/tramway

Yamina Elouardi
Médiatrice tramway
de l'avenue de la Constitution
au boulevard Ayrault
Tél. : 06 66 62 19 91

Maitre d'ouvrage



Partenaires financiers



Partenaires institutionnels



Mandataires / maîtres d'œuvre / architectes



Entreprises titulaires



Concessionnaires / gestionnaires réseaux



Réalisation graphique




Pour la direction de la communication
Angers Loire Métropole
Tél. : 02 41 05 59 31 / Fax : 02 41 05 59 49




www.angersloiremetropole.fr/tramway



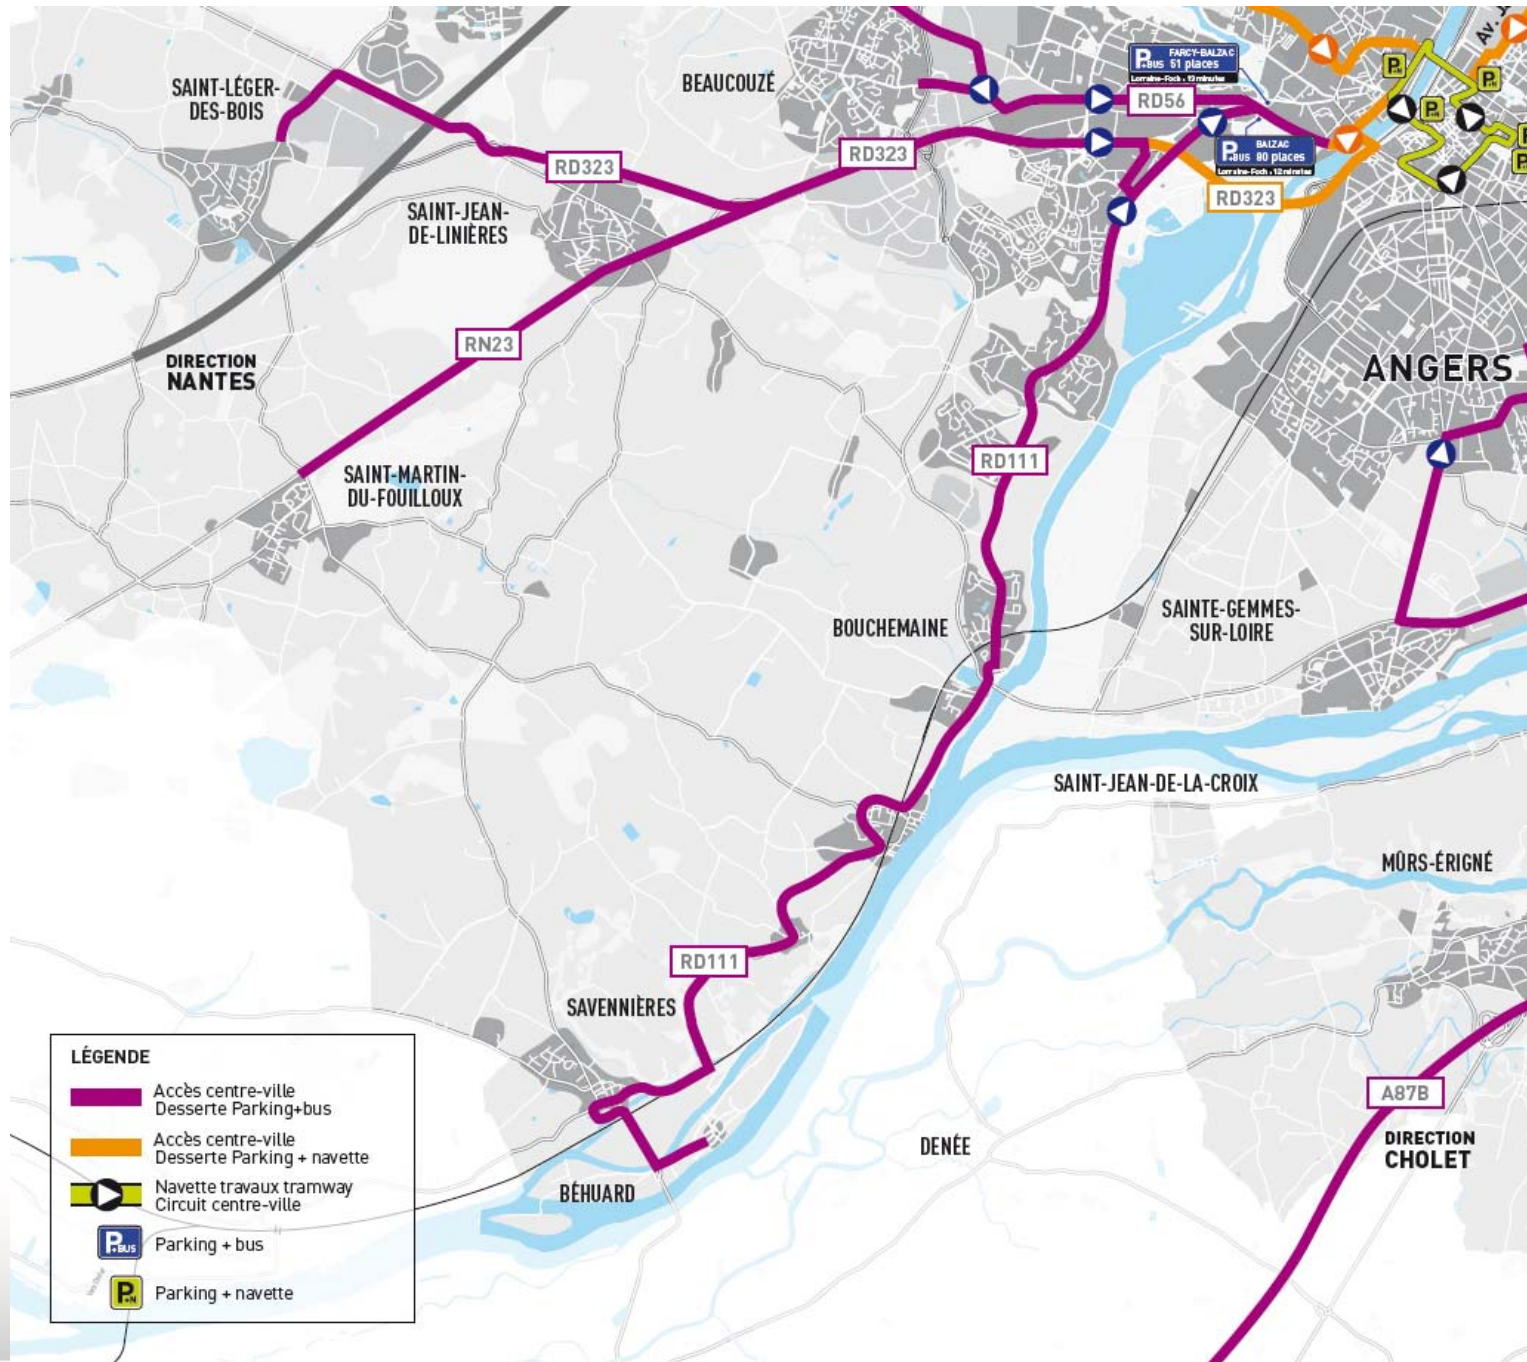

[Conférence de presse - Voie sur berges]

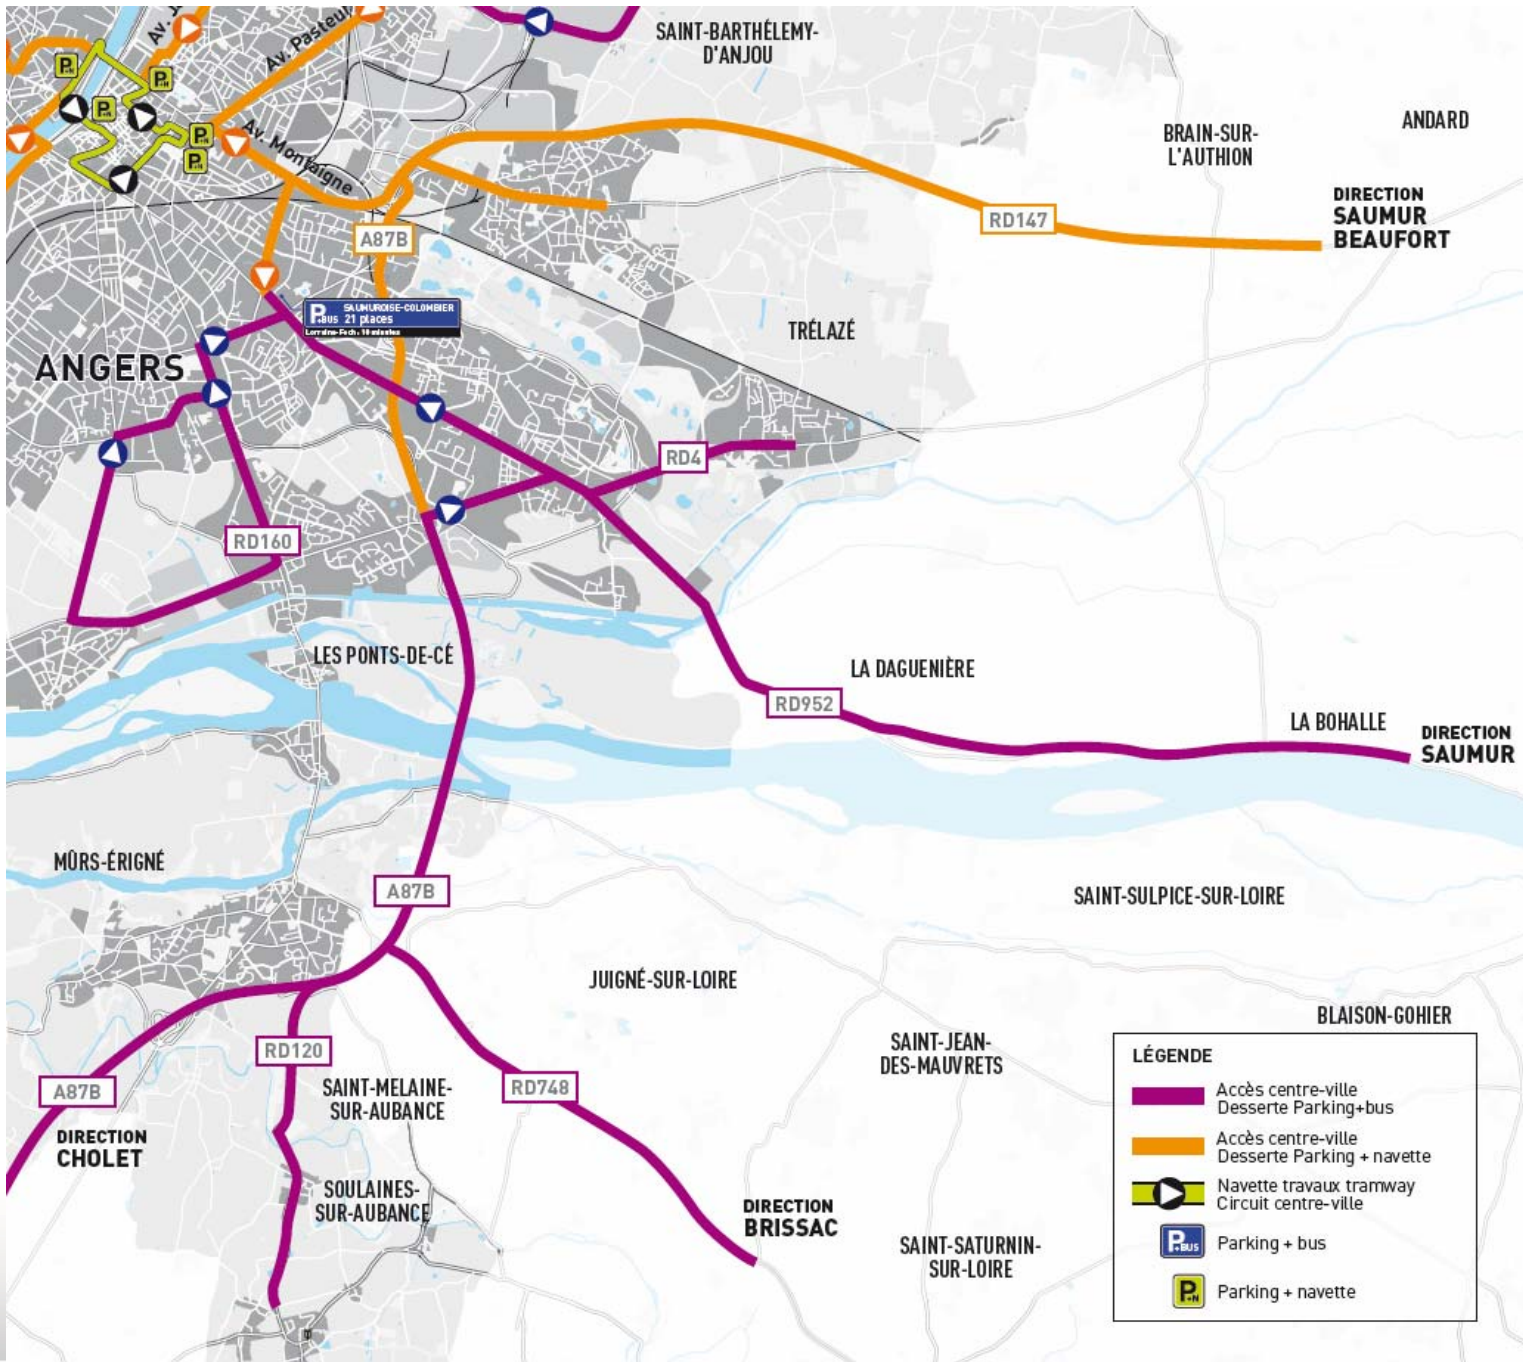

[Conférence de presse - Voie sur berges]
